Objednávateľ: Žilinský samosprávny kraj

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Rekonštrukcia ciest II. a III. triedy vedúcich k NKP v rámci 5 historických regiónov kraja - región Turiec

SO 101 Obnova vozovky III/2132 v km 8,235 - 9,571 (úsek - obec Sklabiňa)

AKTIVITA	Doba trvania	M.J.	Výmera
Frézovanie hr. 50 mm	3	m^2	10 882
Odstránenie + spevnenie krajnice	3	m^2	375
Pokládka AC11O II. hr. 50 mm	5	m^2	10 882
Pokládka AC16L II. hr.50mm	1	m^2	350
Osadenie smerových stĺpikov + ZDZ + VDZ	7		
Zálievky z modif. asfaltu	2	m	1 634
Inžinierska činnosť; od 3.9 - do 20.9.2021			

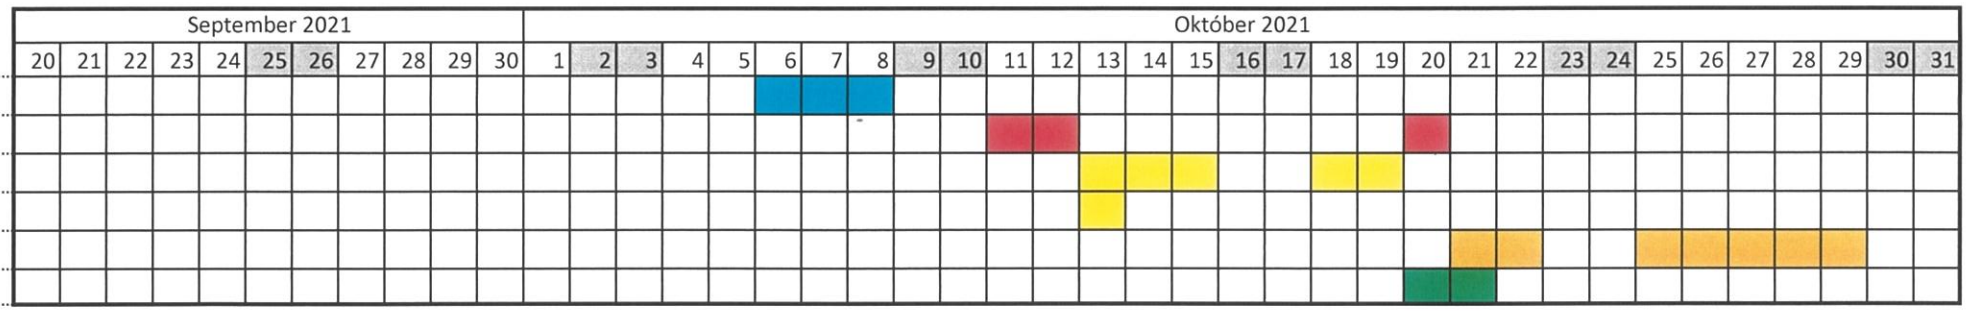

Poznámka: Doba realizácie sa môže meniť vplyvom klimatických podmienok

SO 102 Zosilenie vozovky III/2132 v km 21,082 - 23,933 (úsek - obec Folkušová - Blatnica)

AKTIVITA	Doba trvania	M.J.	Výmera
Frézovanie hr. do 30 mm	4	m^2	22 635
Odstránenie + spevnenie krajnice	10	m^2	3 120
Pokládka AC11O II. hr. 50 mm	8	m^2	22 635
Pokládka AC16L II. hr.50mm	1	m^2	227
Osadenie smerových stĺpikov + VDZ	8		
Zálievky z modif. asfaltu	2	m	2 911
Inžinierska činnosť; od 3.9 - do 20.9.2021			

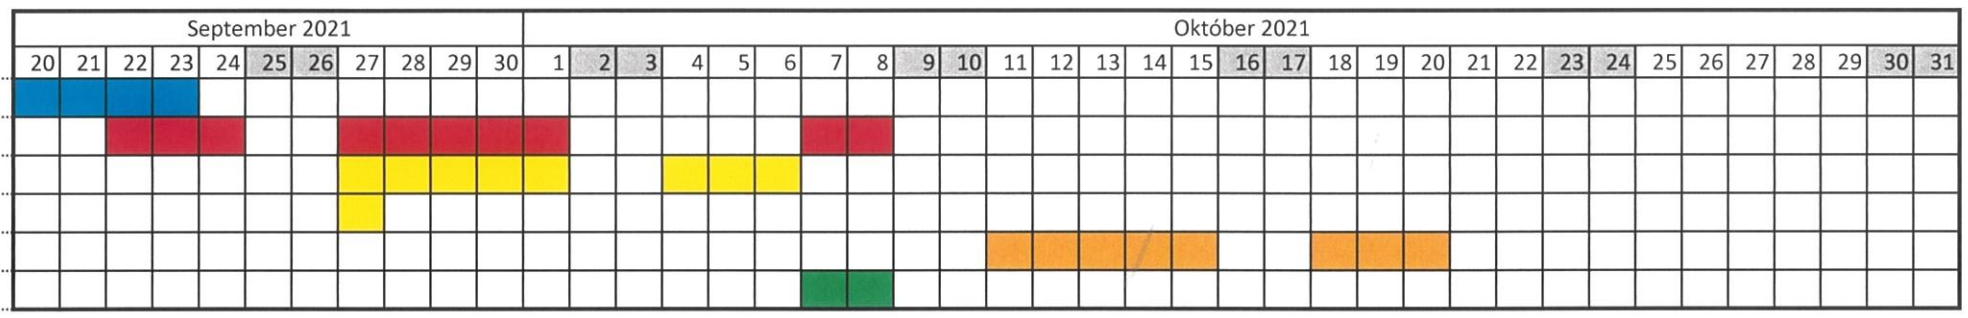

Poznámka: Doba realizácie sa môže meniť vplyvom klimatických podmienok

SO 103 Obnova a zosilenie vozovky III/2132 v km 28,524 - 29,754 (úsek - obec Mošovce)

AKTIVITA	Doba trvania	M.J.	Výmera
Frézovanie hr. do 30 mm + hr. 50 mm	2	m^2	8 584
Odstránenie + spevnenie krajnice	6	m^2	862
Pokládka AC11O II. hr. 50 mm	4	m^2	8 584
Pokládka AC16L II. hr.50mm	1	m^2	86
Osadenie smerových stĺpikov + ZDZ + VDZ	7		
Zálievky z modif. asfaltu	2	m	1 441
Inžinierska činnosť; od 3.9 - do 20.9.2021			

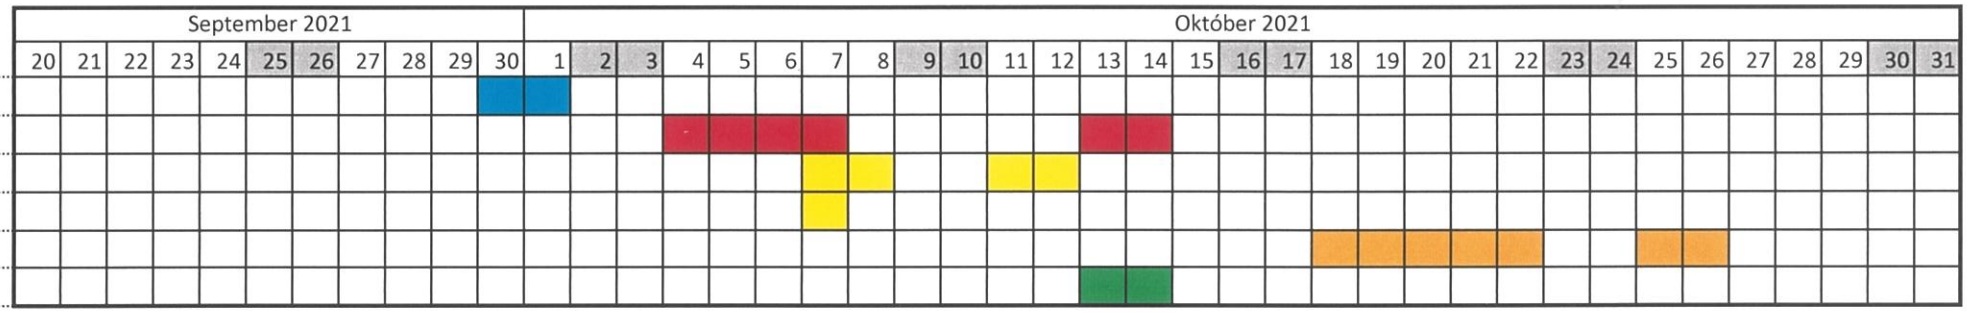

Poznámka: Doba realizácie sa môže meniť vplyvom klimatických podmienok

Doprastav
Doprastav, a.s.
ZÁVOD ŽILINA
Jesenského 18, 010 37 Žilina
0391-3
